3er. INFORME TRIMESTRAL 2014

Julio

Trabajos de apoyo a las obras de pavimentación de las calles Emiliano Zapata y Celerino Manzanares
Personal del SCAPSZ corrigió fugas derivadas de las obras de pavimentación y reconectó 125 tomas de la Calle Emiliano Zapata y 140 tomas de la Calle Celerino Manzanares.
Población beneficiada: Calles Emiliano Zapata y Celerino Manzanares.
Inversión $ 15,500.00 SCAPSZ

Calle Emiliano Zapata. Zacatepec Centro:

Calle Celerino Manzanares. Galeana Centro:

Apoyo a Dirección de Obras Públicas en reconstrucción de drenaje en Calle Dorado esq. Atencingo
Diseño y colocación de tubo de 8” para agua potable para librar tubería de drenaje que cruza por debajo.
Población beneficiada: Ambas calles
Inversión: $ 2,500.00 SCAPSZ

Continúan los trabajos de apoyo a la construcción del Estadio “Coruco Díaz”

Agosto

Cambio de bomba y tubería Pozo Josefa Ortiz de Domínguez

Bomba y tubería dañadas por corrosión. Por falta de presión y caudal se procedió a desinstalar la bomba de 20 hp detectándose daño grave por corrosión tanto en bomba como en columna de bombeo. Se procedió a instalar una bomba reparada de 40 hp y cambio de columna de bomba fabricada en PVC a prueba de corrosión. Se cambió así mismo el relevador bimetálico al arrancador.

Población Beneficiada: Col. Josefa Ortiz de Domínguez

Inversión: $ 52,000.00 SCAPSZ

Maniobra:

Tubería dañada y tubería nueva:

Bomba de repuesto:

Bomba dañada:

Detalle tubería de PVC a prueba de corrosión:

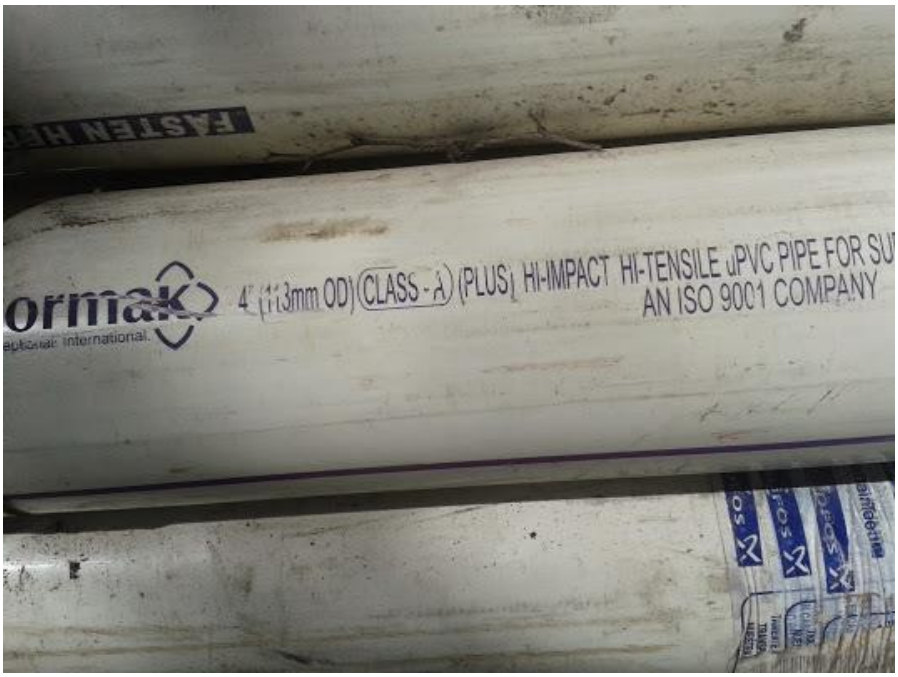

Relevador bimetálico nuevo:

Cambio de bomba Pozo Galeana Centro por descompostura.
Con fecha 14 de agosto se quemó el motor de la Bomba Galeana Centro, retirándose la bomba el día siguiente, permaneciendo el pozo sin servicio hasta el día 20 del mismo mes en que se reinstaló la misma bomba reparada.
Población beneficiada: Galeana Centro y Lázaro Cárdenas Galeana
Inversión: $ 31,500.00 SCAPSZ

Desazolve de drenajes con camión tipo Vactor.
Con fecha 19 y 20 de agosto se dio servicio de desazolve a drenajes de las Colonias Centro, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y Plutarco Elías Calles.
Población Beneficiada: Mismas colonias
Inversión: $ 35,000.00 (50% H. Ayuntamiento; 50% SCAPSZ)

Septiembre

Reparación de tubería de agua potable tramo "Puente Negro"

Con fecha 4 de septiembre la crecida de la barranca a la altura del puente negro arrastró el tubo de 3" que da servicio a la Sección Los Arcos, Col. 20 de Noviembre. El día 5 de septiembre se procedió a reconstruir el tramo.

Población beneficiada: Sección Los Arcos, Col. 20 de noviembre

Inversión $ 9,500.00 SCAPSZ

Desazolve Drenaje Calle Niños Héroes
El 23 de septiembre se contó con el apoyo del Vactor del Municipio de Xochitepec para desazolvar el drenaje de la Calle Niños Héroes.
Población beneficiada: Calle Niños Héroes
Inversión: $ 0.00

Reparación Bomba Pozo Vicente Guerrero
El 30 de julio una falla eléctrica provocó que el motor de 62 Hp del Pozo Vicente Guerrero se quemara por lo que se consiguió un equipo en préstamo, instalándose la bomba reparada el día 24 de septiembre.
Población beneficiada: Cols. Vicente Guerrero, Arboledas y Buenavista
Inversión: 38,500.00 SCAPSZ

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014:

SERVICIOS	TOTAL
Fugas en la calle	187
Desazolve de drenaje	21
Cortes de pavimento	11
Reconexión de servicio	42
Verificar factibilidad	3
Poner cuchillas	4
Tomas tapadas	27
tomas clandestinas	4
Varios (transportar fierro para reparación de alcantarillas, cambios de válvulas, cambios de abrazadera, apoyos a protección civil, instalación de bomba, etc.)	19
Reparación válvula 12, 8, 3	4
Instalación de toma nueva	38
Cancelación de servicio por desperdicio, adeudo de agua, o temporal.	26
Reparación de tubo14, 12, 8,3", 2 1/2",2	18
Repartir cloro a pozos	12
Total de servicios	**416**

DIRECCIÓN GENERAL (Actividades administrativas)	TOTAL
Visitas CONAGUA	8
Visitas CEA	9
Visitas Servicio de Administración Tributaria	2
Trámites/aclaraciones CFE	5
Reuniones con comités/grupos de usuarios	7
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	1
Entrevistas en estación de radio (Súper Z)	1
Foros/Convenciones	2

JORGE E. BENET KEIL
Set. 30, 2014.
